

De mi-août à début septembre 2022 installation de chantier



Installation chantier



Démarrage des travaux du trop plein



Installation de l'atelier de préforages



Talus bâché



Stockage des palplanches



Vue générale



Préforage en cours sur E3



Moraine compacte (déblais préforage E3)



Battage palplanches sur E1



Talus protégé



Vue générale



Traversée de route avec les conduites de trop plein

20 septembre 2022



Préforage sur E3



Vue générale



Battage sur E1



Analyses eau dans le cadre du SER



Cheminement piétons le long de la route



Remblayage trop-plein en cours



Fermeture du rideau de palplanches (E4-E5)



Forage inclinomètre I2



Bloc calcaire



Vue générale

29 septembre au 4 octobre 2022



Terrassement 1^{ère} étape (photo du 29/09/2022)



Terrassement 1^{ère} étape (photo du 30/09/2022)



Terrassement 1^{ère} étape (photo du 04/10/2022)



Ancrages élévation E1 en cours



Protection inclinomètre I2



Visite bureau RWB ☺



Aménagement de la place et rigole de récupération des eaux



Élévation E1 ancrages en cours de réinjections



Forages en cours sur élévation E4 (échelle à changer)



Vue générale



Vue générale



Longrine sur 1^{er} rang d'ancrages



Pose longrines



Foreuse en place sur E2



Citerne diesel dans bac de rétention



Bâche sous compresseur



Solde forages du 1^{er} rang



Ancrages E4 / E5



Angle E1 / E2



Vue générale



Place installation grue



Venues d'eau devant E5

1er novembre 2022



Terrassement 2ème niveau ancrage



Mise en tension ancrage 3



Puisard devant E5



Vue générale

8 novembre 2022



Vue générale




Réinjections en cours sur le 2ème rang d'ancrages



Bassin de décantation



Déchets à évacuer à l'arrière du rideau de palplanches

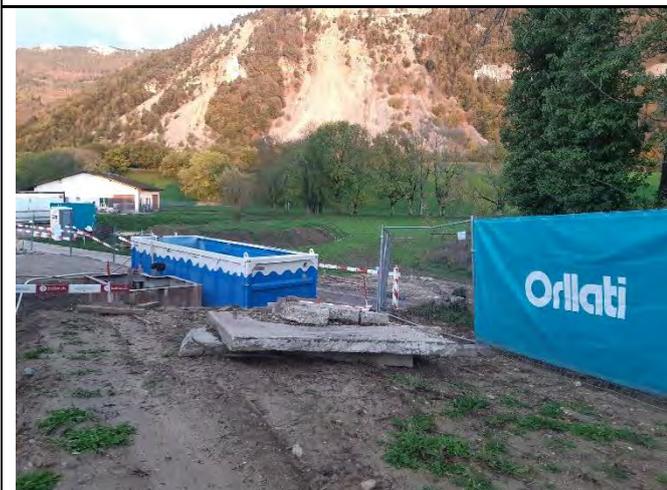

Dalle béton à évacuer



Vue élévation E1



Grue montée



Gravier pour drainer l'eau sous la future dalle



Local Technique et Bassins



Bassins



Local Technique et Bassins



Local Technique



Bétonnage du radier de propreté du local technique



Évacuation des eaux de drainage et du trop plein



Béton maigre du radier de propreté des cuves



Évacuation des eaux de drainage et du trop plein



Béton maigre du radier de propreté des cuves




Local technique et radier des bassins



Neige sur le radier des cuves en béton maigre



Neige sur le radier du local technique et des bassins

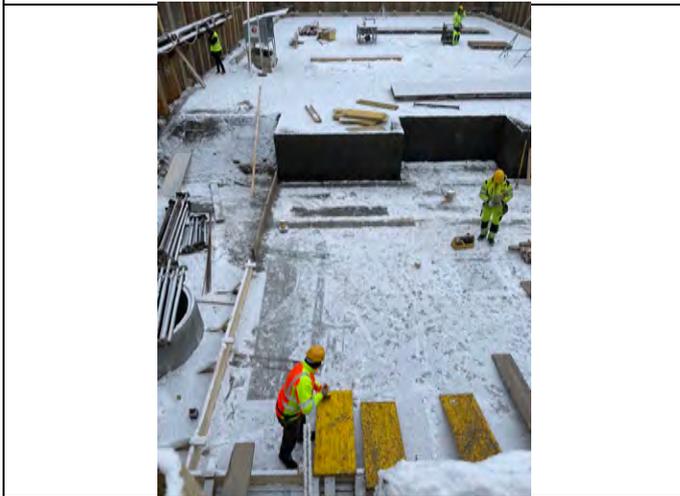

Préparation pour couler la dalle du radier du local Technique



Préparation pour couler la dalle du radier du local Technique



Vue entre du local Technique et du mur des bassins



Vue sur la zone des bassins

26 décembre 2022



Vue générale du stock des panneaux de coffrage pendant la pose de Noël



La dalle du radier du local technique est terminée, pour les bassins seul le béton maigre de propreté est terminé



La place de travail et de stockage est prête pour la la reprise de janvier


24 janvier 2024



Dalle du radier des bassins en béton armés coulée en un jour



Dalle du radier des bassins en béton armés coulée en un jour

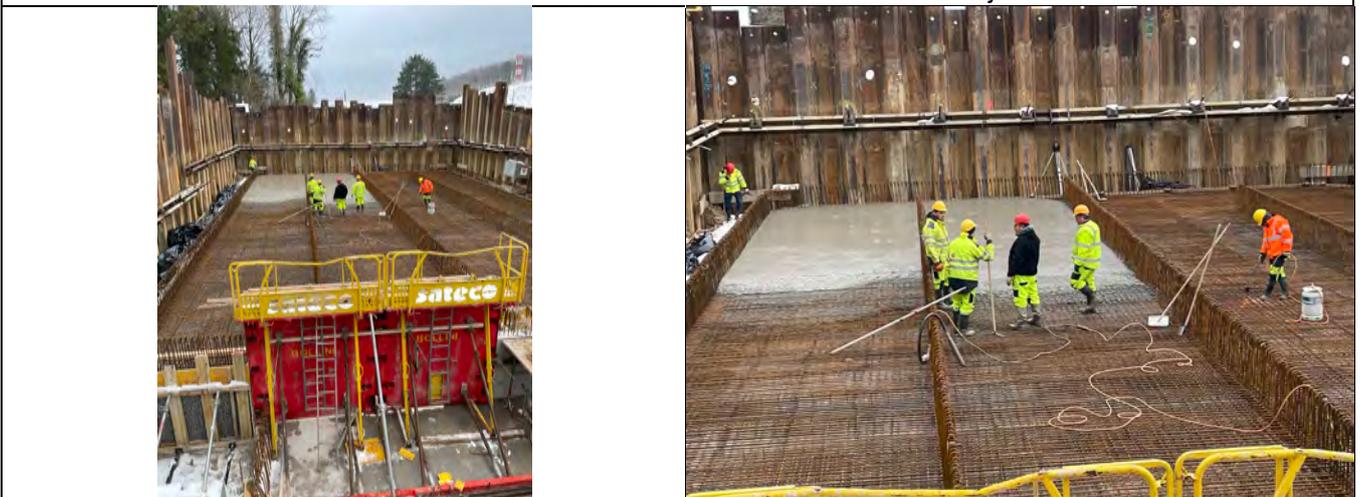

Dalle du radier des bassins en béton armés coulée en un jour


31 janvier 2023



Coffrage des murs pour les 3 premières étapes



Coffrage des murs pour les 3 premières étapes

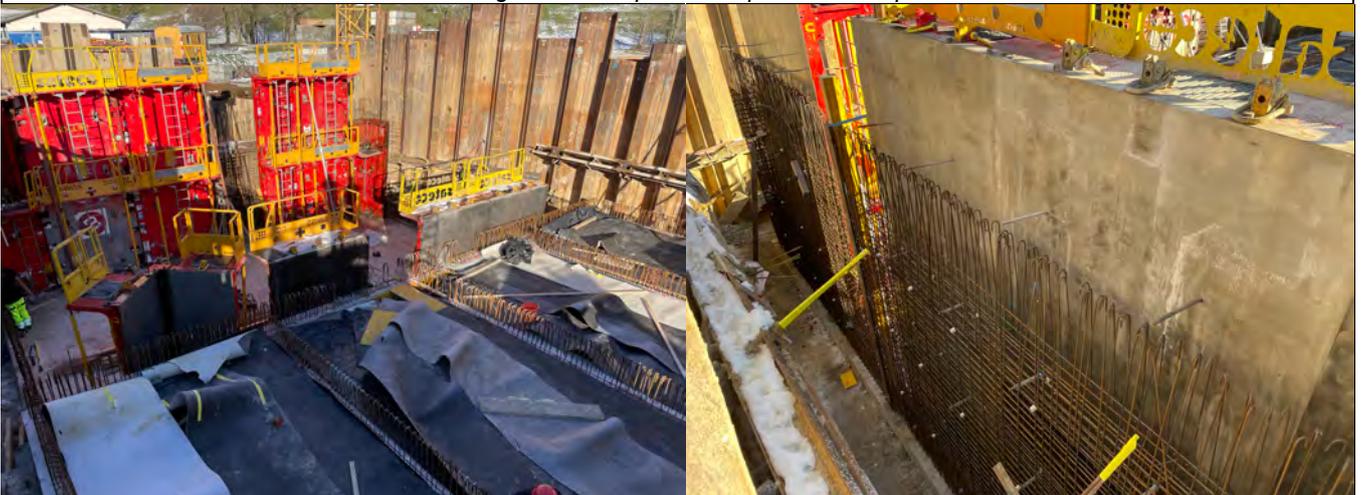

Coffrage des murs pour les 3 premières étapes

7 février 2023



Les 3 premières étapes sont coulées, coffrage des 3 suivantes



Les 3 premières étapes sont coulées, coffrage des 3 suivantes



Les 3 premières étapes sont coulées, coffrage des 3 suivantes

14 février 2023



6 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes



6 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes



6 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes

21 février 2023



Les 9 premières étapes sont coulées, coffrage des 3 suivantes



Les 9 premières étapes sont coulées, coffrage des 3 suivantes



Les 9 premières étapes sont coulées, coffrage des 3 suivantes

28 février 2023



12 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes



12 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes



12 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes


14 mars 2023



17 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes



17 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes

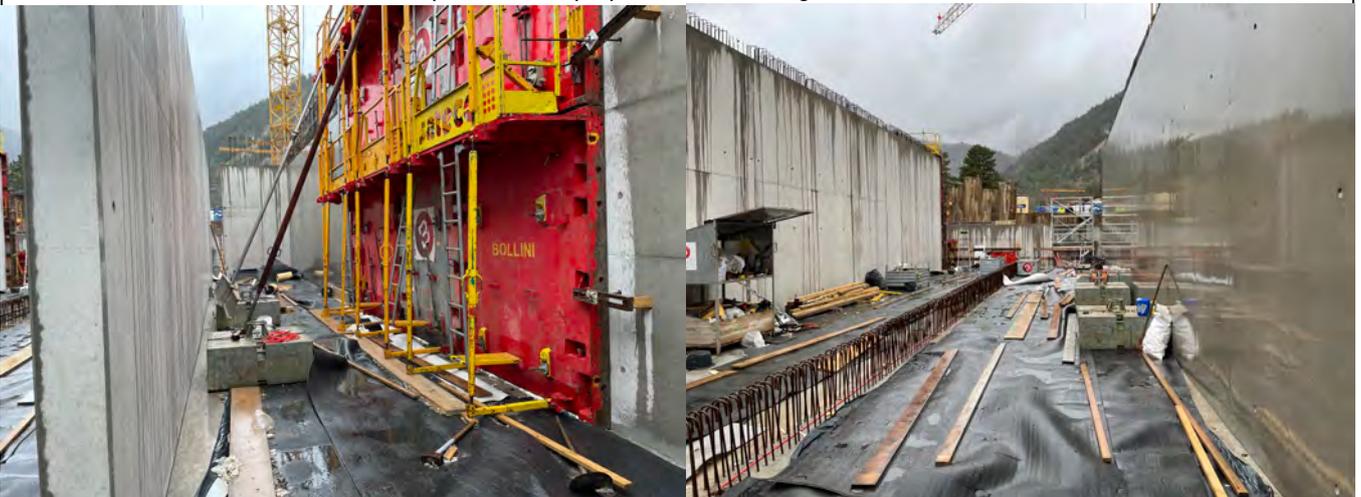

17 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes

28 mars 2023



23 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes



23 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes



23 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes

4 avril 2023



26 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes



26 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes



26 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes

11 avril 2023



Les murs des réservoirs sont terminés, préparation du coffrage de la dalle du plafond



Dalle intermédiaire du local technique coulée



Dalle intermédiaire du local technique terminée

18 avril 2023



Coffrage des murs du local technique et de la dalle des cuves



Coffrage des murs du local technique et de la dalle des cuves



Coffrage des murs du local technique

26 avril & 2 mai 2023



26 avril 2023 Ferrailage de la dalle du plafond du réservoir



2 mai 2023 dalle du plafond du réservoir coulée le vendredi 31 avril 2023



2 mai 2023 Dalle du toit et porte d'entrée du réservoir

16 mai 2023



Vues de la dalle du toit du réservoir



Ferrillage du trou de sortie des étais de la dalle du toit

Étais et coffrages dans le local technique de la dalle du toit



Couloir et entrée du bassin côté Jura

30 mai 2023



Trou de sortie des étais depuis la dalle bétonnée et tubes pour l'injection dans les joints d'étanchéités



Isolation du plafond et des 3 murs du local technique supérieur et vue du local technique inférieur



Entrée du bassin de gauche côté Jura

13 juin 2023

<i>Tests d'étanchéité des cuves du réservoir</i>	
<i>23 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes</i>	
<i>23 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes</i>	

27 juin 2023

<i>Tests d'étanchéité des cuves du réservoir</i>	
<i>23 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes</i>	
<i>23 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes</i>	

11 juillet 2023

<i>Tests d'étanchéité des cuves du réservoirs</i>	
<i>23 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes</i>	
<i>23 étapes coulées, préparation du coffrage des 3 suivantes</i>	
